

CALLE MODESTO LAFUENTE Nº 63

COMENTARIOS PARA JUNTA DE VECINOS

PPTO. Ref: MDLF_EN2023

Enero del año 2023

Un año convulso, como ha sido el dos mil veintidós, con lluvias torrenciales, y temperaturas en rangos muy diferenciados, nos muestra el presente más cercano al cual nos enfrentamos. El informe pretende mostrar los avances realizados estos últimos meses y concienciarnos para estar preparados, anticiparnos a lo que nos muestra el presente, la actualidad de las condiciones atmosféricas y el estado de nuestro edificio.

La Comunidad de propietarios ha comenzado, el camino para poner al día, todos los elementos del edificio. Se trata de una labor a medio plazo, incluso largo plazo, con algunas reparaciones de mayor calado y otras que no lo son tanto, para pasar, una primera fase de cierta urgencia, hasta llegar a una siguiente de prevención.

El objetivo de los trabajos que se han realizado y que se prevén realizar buscan una mejora de la calidad física del edificio para llegar a un estado del mismo sin averías, o si se produjeran, el impacto de las mismas fuera el mínimo. Una inversión económica actual significa un menor gasto en averías y daños, así como eliminar las molestias a los vecinos en sus hogares cuando estas se producen. Buscamos una mejor calidad de vida y el disfrute de nuestro edificio donde vivimos o donde invertimos para ofrecérselo a nuestros inquilinos.

ACTUACIONES REALIZADAS

Existen diversos tipos de actuaciones convencionales, las de pequeño calado, menos impactantes, y las de gran envergadura.

Entre las de gran envergadura, se realizaron trabajos en las **fachadas delanteras**, de forma parcial, con la rehabilitación de ciertos elementos que se encontraban en un estado no deseado. Se produjo la actuación en la fachada principal de Modesto Lafuente y en el lateral de María Panés.



En la fachada trasera se actuó en dos zonas separadas que coincidían con patios y una cubierta a su vez, compartidos con otras comunidades.



Sin embargo, no debemos olvidar esas pequeñas actuaciones que se han realizado en este periodo y que se corresponden con la reposición de una losa de mármol, retirada de radiador no necesario, reposición de esquina en un respiradero, sellados en frontal de terraza mediante descuelgue, impermeabilización de entrada a azotea y pintura de muretes, pequeñas

pintura de
de portero
murete de



reparaciones de albañilería en la misma zona, saneado y cuarto de máquinas de ascensores, nueva cubierta en vivienda



junto a sellados varios y pintura de la misma.



Eliminación de antigua chimenea

Para finalizar estas pequeñas actuaciones, queremos dejar constancia de uno de los objetivos de las actuaciones presentes y futuras, en la que mostramos a continuación: la junta rectora de la comunidad nos encargó la colocación de registros, mediante portezuelas con llave, en dos chimeneas. Anteriormente, cuando sucedía una avería, para acceder a su interior, se procedía a la realización de un hueco, que al finalizar se cerraba y pintaba. Así se actuaba cada vez que era necesario reparar o verificar algún elemento en su interior. Desde la implantación



de estos registros, el acceso es inmediato en caso de avería o comprobación de los elementos comunes que discurren por el interior de estos respiraderos. Al realizar esta actuación, reducimos

futuros costes de ejecución y nos permitirán realizar revisiones periódicas que ahora no se realizan y evitarán futuras averías, así como el coste de las mismas.

ACTUACIONES EN FACHADA DELANTERA

Hemos comentado que se actúa de forma parcial en los dos tramos de la fachada delantera, En la “L” que forma la misma. Pretendemos mostrar, de forma visual un antes y un después, sin pormenorizar la descripción de los trabajos o los materiales utilizados que se describen en los documentos entregados con las mediciones y costes de los mismos.

La rehabilitación se desarrolló en las zonas correspondientes a las zonas de piedra artificial, zona de ventanas.



Estado anterior



Estado actual

Inicialmente nos encontramos una superficie general de trabajo con alto desgaste, y zonas puntuales, numerosas, con huecos y rotos de piedra, así como falta de sellados entre piezas. Las manchas generalizadas son el menor de los males.



Mostramos, a continuación, la rehabilitación de una de las zonas derruidas.



Estado anterior



Estado rehabilitado



Estado anterior con rotura



Inicial de rehabilitación



Rehabilitación intermedio



Acabado, estado final

Estado rehabilitado



Estado anterior

Estado rehabilitado




Estado anterior



Estado rehabilitado

ACTUACIONES EN FACHADA TRASERA

La actuación en las fachadas principales era necesaria, aún más lo eran el resto de trabajos en las zonas que se ha actuado en la parte no principal. El estado que presentaban las superficies podemos calificarlas de muy alta degradación. Al estado general de las superficies sobre las que se actuó que era de muy alta degradación, tendríamos que añadir huecos de pequeñas y otros de gran dimensión o tamaño, llegando a faltar el necesario recubrimiento de mortero en zonas en las que se observaba el hierro corrugado, ya oxidado.

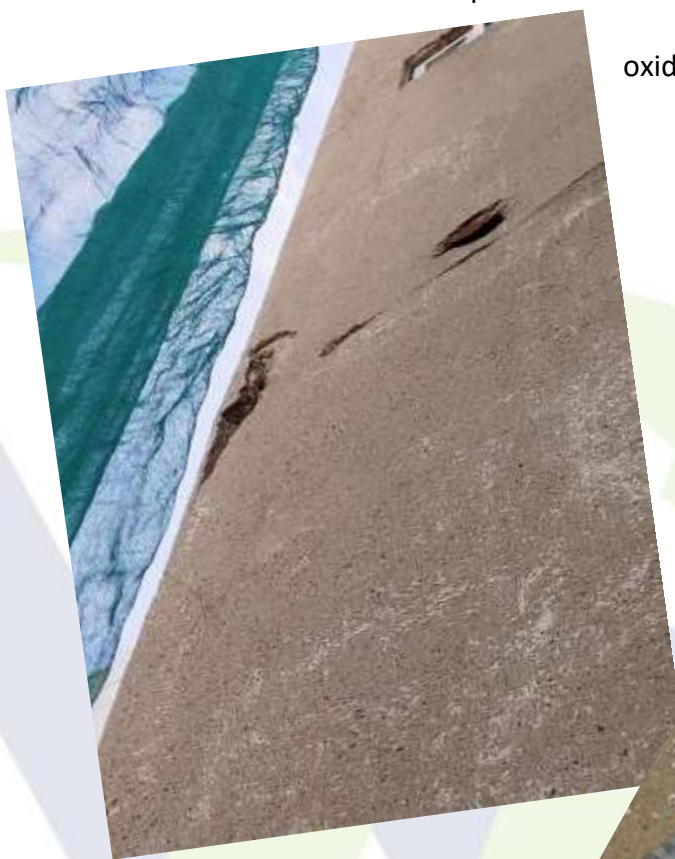

Detalles antes de actuación

ZONA UNO TRASERA



Antes de actuación



Detalles durante rehabilitación



Detalles de acabado



ZONA DOS TRASERA




Estado anterior



Estado rehabilitado



Detalles

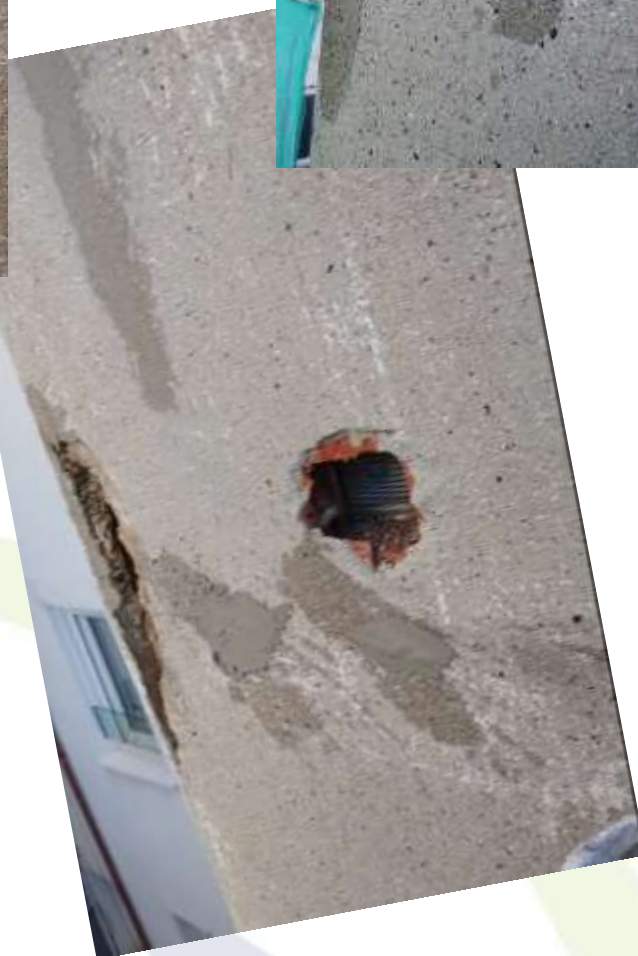



Detalles durante ejecución



En la fotografía, que aparece a izquierdas de este texto, podemos observar el patio que hemos llamado “zona dos trasera” en la cual podemos comprobar el estado de **muy alta disgregación** del paramento vertical. Así mismo en la base de la ventana aparece un ladrillo desprotegido.

En la foto que aparece a derechas aparece una fotografía una vez realizada la rehabilitación del patio.



ACTUACIONES FUTURAS

Se han realizado en ambas terrazas superiores, séptimo “B” y octavo “B” trabajos de urgencia debidos a humedades que han generado las mismas. El estado de las terrazas no es el más idóneo para responder a un futuro con un clima tan extremo puntualmente en cada estación, por lo cual proponemos actuaciones de rehabilitación en las mencionadas terrazas, entre que se incluiría una impermeabilización de las mismas y reacondicionamientos de pendientes en diversas zonas, dentro de actuaciones generales.



Actuación sobre sumidero y junta de dilatación que causó humedades en piso inferior



Detalle encontrado en dicha terraza, piezas que se desmoronaban con un dedo, en la misma terraza, octavo “B”.



Actuación de urgencia en terraza del séptimo “B” con producto aplicado sobre humedad y con lluvia para evitar humedades en el piso inferior. En esta ocasión sucedió el mismo desmoronamiento que el aparecido en la fotografía superior al aplicar el producto.

Comentar, a modo de resumen, que se han realizado una serie de actuaciones obligadas por la ITE/IEE (Informe de Evaluación del Edificio), en fachadas delanteras y en las fachadas traseras (linde con otras dos comunidades). Sin embargo, esta obligatoriedad no debe esconder que existía el peligro de desprendimiento de elementos de las fachadas con el consiguiente peligro para viandantes, y por último el muy mal estado físico del edificio. De no haber realizado los trabajos a que nos obligaba la legislación vigente, con seguridad, las lluvias de meses pasados hubieran afectado a nuestros hogares por filtraciones y humedad, sin olvidar el peligro existente de desprendimiento a los viales de la calle que no hubiera sido corregido. No debemos olvidar que nuestro edificio es un **“elemento vivo”** y con el paso de los años, debemos realizar las revisiones oportunas y tratamientos para disfrutar del mismo con la máxima calidad.

Existen otros requerimientos en el edificio que se encuentran en curso. Se ha comenzado a impermeabilizar la salida a cubierta superior, se han reparado elemento que requerían albañilería y han recibido pintura los petos y demás elementos de esa zona.

No debemos olvidar, que en un futuro no muy lejano



debemos

realizar una labor de sellado sobre la cristalera del patio que se accede por el cuarto de basuras.

Y en el arriba mencionado nuevo acceso a las chimeneas de respiración donde se han incorporado portezuelas se deberá realizar una inspección, pues desde bastantes meses atrás, se producen olores que afectan a numerosos pisos y a cuarto de basuras y al portal.

Finalizamos comentando temas de seguridad en el trabajo (normativa PRL), como es la escalera de acceso a la cumbre del edificio En la cual se debe instalar la protección correspondiente, pero ya hablamos de un escenario a medio plazo.

En nuestras manos se encuentra la mejora de nuestro edificio, que es la nuestra propia. Continuar el camino que hemos comenzado.

